



Basis für Kostenverfolgung in der Umsetzungs-/Bauphase

Struktur-Elemente (SEN)

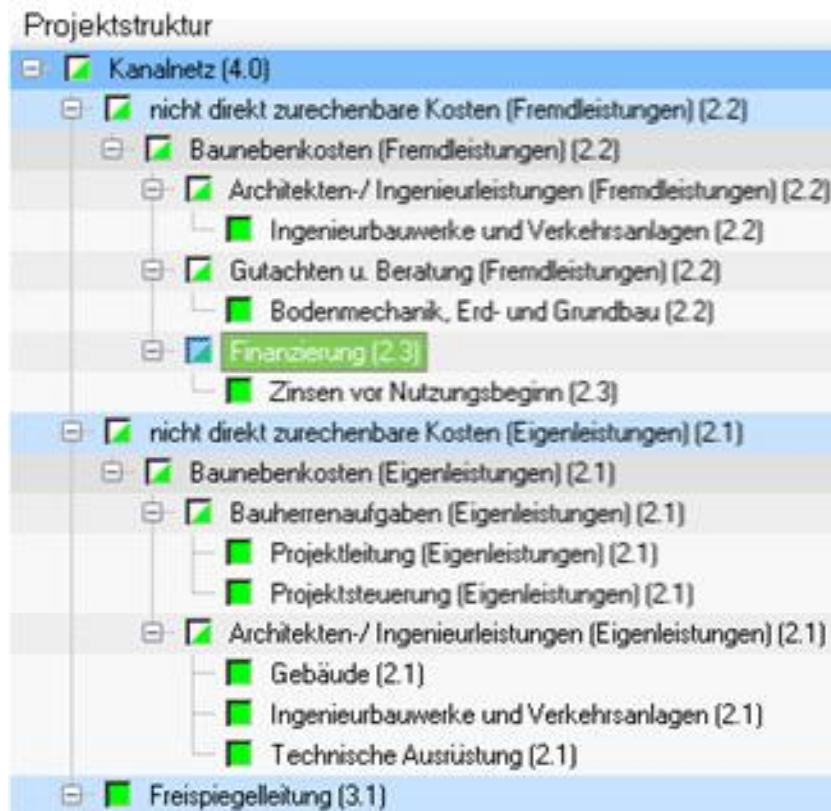

Verdichtung auf Kostenarten

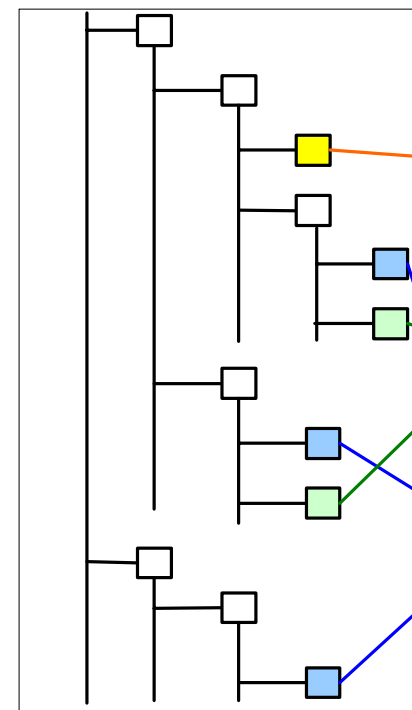

Zuordnung zu Vergabeeinheiten (VE)

- VE 1: Außenanlagen
- VE 2: Rohbau
- VE 3: MT + E-/MSR
- VE 4: Planung fremd

Mittelabfluss als Ergebnis veranlasster Bestellungen, BANF'en und Eigenleistungen

Mittelabfluss für den Stichtag : 02.04.2013

Aufträge (Letzte Zahlung am 28.02.2013)					Vorj
Bestellungen	Datum	Dauer	Bestell-summe	Bis End	Zahlungen
1	2	3	4	5	
6850029368;00010 :	14.01.11	1 Mon.	1.438 €	1.438 €	
6850029634;00010 :	25.01.11	24 Mon.	16.819 €	16.329 €	
6850038890;00010 :	14.05.12	1 Mon.	54.413 €	8.900 €	
6850039479;00010 :	15.06.12	1 Mon.	12.233 €	8.808 €	
6850040906;00010 :	05.09.12	4 Mon.	536 €	536 €	
6850040906;00020 :	05.09.12	4 Mon.	446 €	446 €	
6850042033;00010 :	07.11.12	1 Mon.	7.657 €		
6850042574;00010 :	05.12.12	1 Mon.	993 €	993 €	
Eigenleistungen : Invest.	18.03.10	73 Mon.	114.171 €	25.164 €	
Bauzeitinsen : Bauzeit.	18.03.10	73 Mon.	100.000 €	1.307 €	
			308.706 €	63.921 €	
